EDENOR - CRONOGRAMA DE PROCESO

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**EDENOR -AGENCIA PILAR**	**38 días**	**mar 04/09/18**	**jue 25/10/18**
2	**Etapa 1: Relevamiento y Croquis Preliminares**	**26 días**	**mar 04/09/18**	**mar 09/10/18**
3	Relevamiento Físico - Ed Bureau Pilar	0 días	mar 04/09/18	mar 04/09/18
4	Reunión Kick Off	0 días	jue 06/09/18	jue 06/09/18
5	Croquis Preliminares: Idea de Partido - Contract	5 días	vie 07/09/18	jue 13/09/18
6	Presentación - Contract	0 días	jue 13/09/18	jue 13/09/18
7	Confirmación Idea de Partido - Edenor	2 días	vie 14/09/18	lun 17/09/18
8	Diseño Conceptual - Propuestas Preliminares	7 días	mar 18/09/18	mié 26/09/18
9	Presentación Propuesta de Diseño - Contract	0 días	mié 26/09/18	mié 26/09/18
10	Feedback de Propuesta - Edenor	2 días	jue 27/09/18	vie 28/09/18
11	Ajuste de Propuesta - Contract	5 días	lun 01/10/18	vie 05/10/18
12	**Presentación de Propuesta de Diseño - Contract**	0 días	vie 05/10/18	vie 05/10/18
13	Aprobación de Diseñó - Edenor	2 días	lun 08/10/18	mar 09/10/18
14	**Etapa 2: Anteproyecto**	**12 días**	**mié 10/10/18**	**jue 25/10/18**
15	Desarrollo de Anteproyecto - Contract	10 días	mié 10/10/18	mar 23/10/18
16	Presentación de Anteproyecto - Contract	0 días	mar 23/10/18	mar 23/10/18
17	Aprobación de Anteproyecto - Edenor	2 días	mié 24/10/18	jue 25/10/18

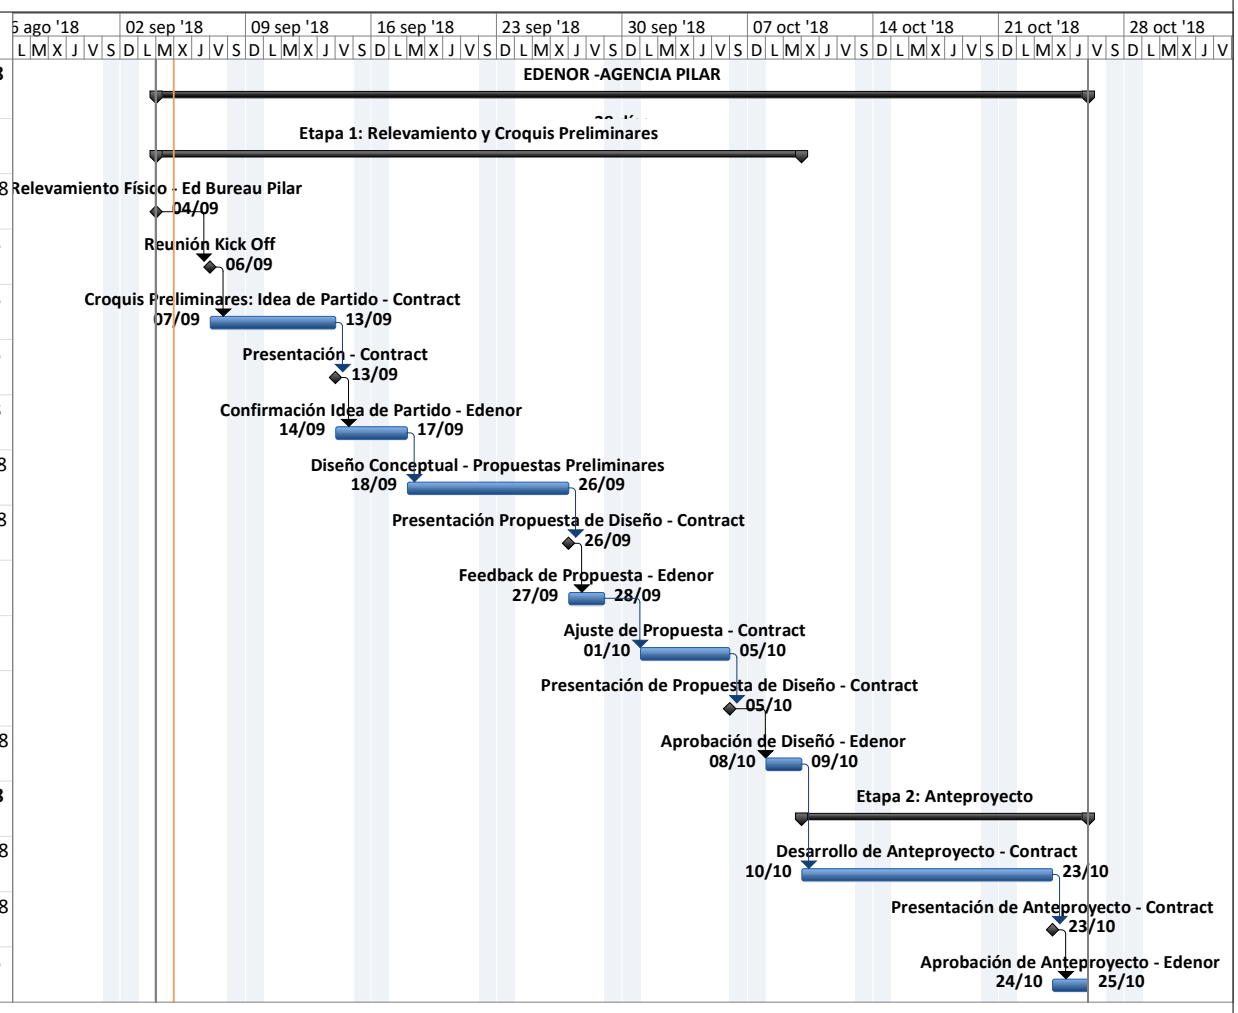

Proyecto: EDENOR - CRONOGRAM
Fecha: mié 05/09/18

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual	
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	
